


N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/03/2011	02/03/2011	1
2	B	Preparazione cantiere	03/03/2011	13/03/2011	10
3	C.1	Scavi e demolizioni tratto c,so itali c,so Vittorio veneto	14/03/2011	20/03/2011	6
4	C.2	Opere e reti di sottosuolo tratto c.so italia c.so Vittorio veneto	21/03/2011	29/03/2011	8
5	C.3	Massetti e pavimenti tratto c.so italia c.so Vittorio veneto	30/03/2011	03/05/2011	34
6	C.4	Opere in ferro tratto c.so italia c.so Vittorio veneto	04/05/2011	05/05/2011	1
7	C.5	Scavi e demolizioni tratto c,so Vittorio veneto via Sanna	06/05/2011	12/05/2011	6
8	C.6	Opere e reti di sottosuolo c,so Vittorio veneto via Sanna	13/05/2011	21/05/2011	8
9	C.7	Massetti e pavimenti tratto c,so Vittorio veneto via Sanna	22/05/2011	25/06/2011	34
10	C.8	Opere in ferro tratto c,so Vittorio veneto via Sanna	26/06/2011	27/06/2011	1
11	D.1	Scavi e demolizioni tratto via Sanna ponte nuovo	28/06/2011	04/07/2011	6
12	D.2	Opere e reti di sottosuolo via Sanna ponte nuovo	05/07/2011	14/07/2011	9
13	D.3	Massetti e pavimenti via Sanna ponte nuovo	15/07/2011	20/08/2011	36
14	D.4	Opere in ferro tratto via Sanna ponte nuovo	21/08/2011	23/08/2011	2
15	E.1	Impianto di illuminazione	24/08/2011	09/09/2011	16
16	E.2	Arredo urbano	10/09/2011	21/10/2011	41
17	F	Pulizie e smobilizzo	22/10/2011	31/10/2011	9
18	G	Fine lavori	31/10/2011	31/10/2011	0

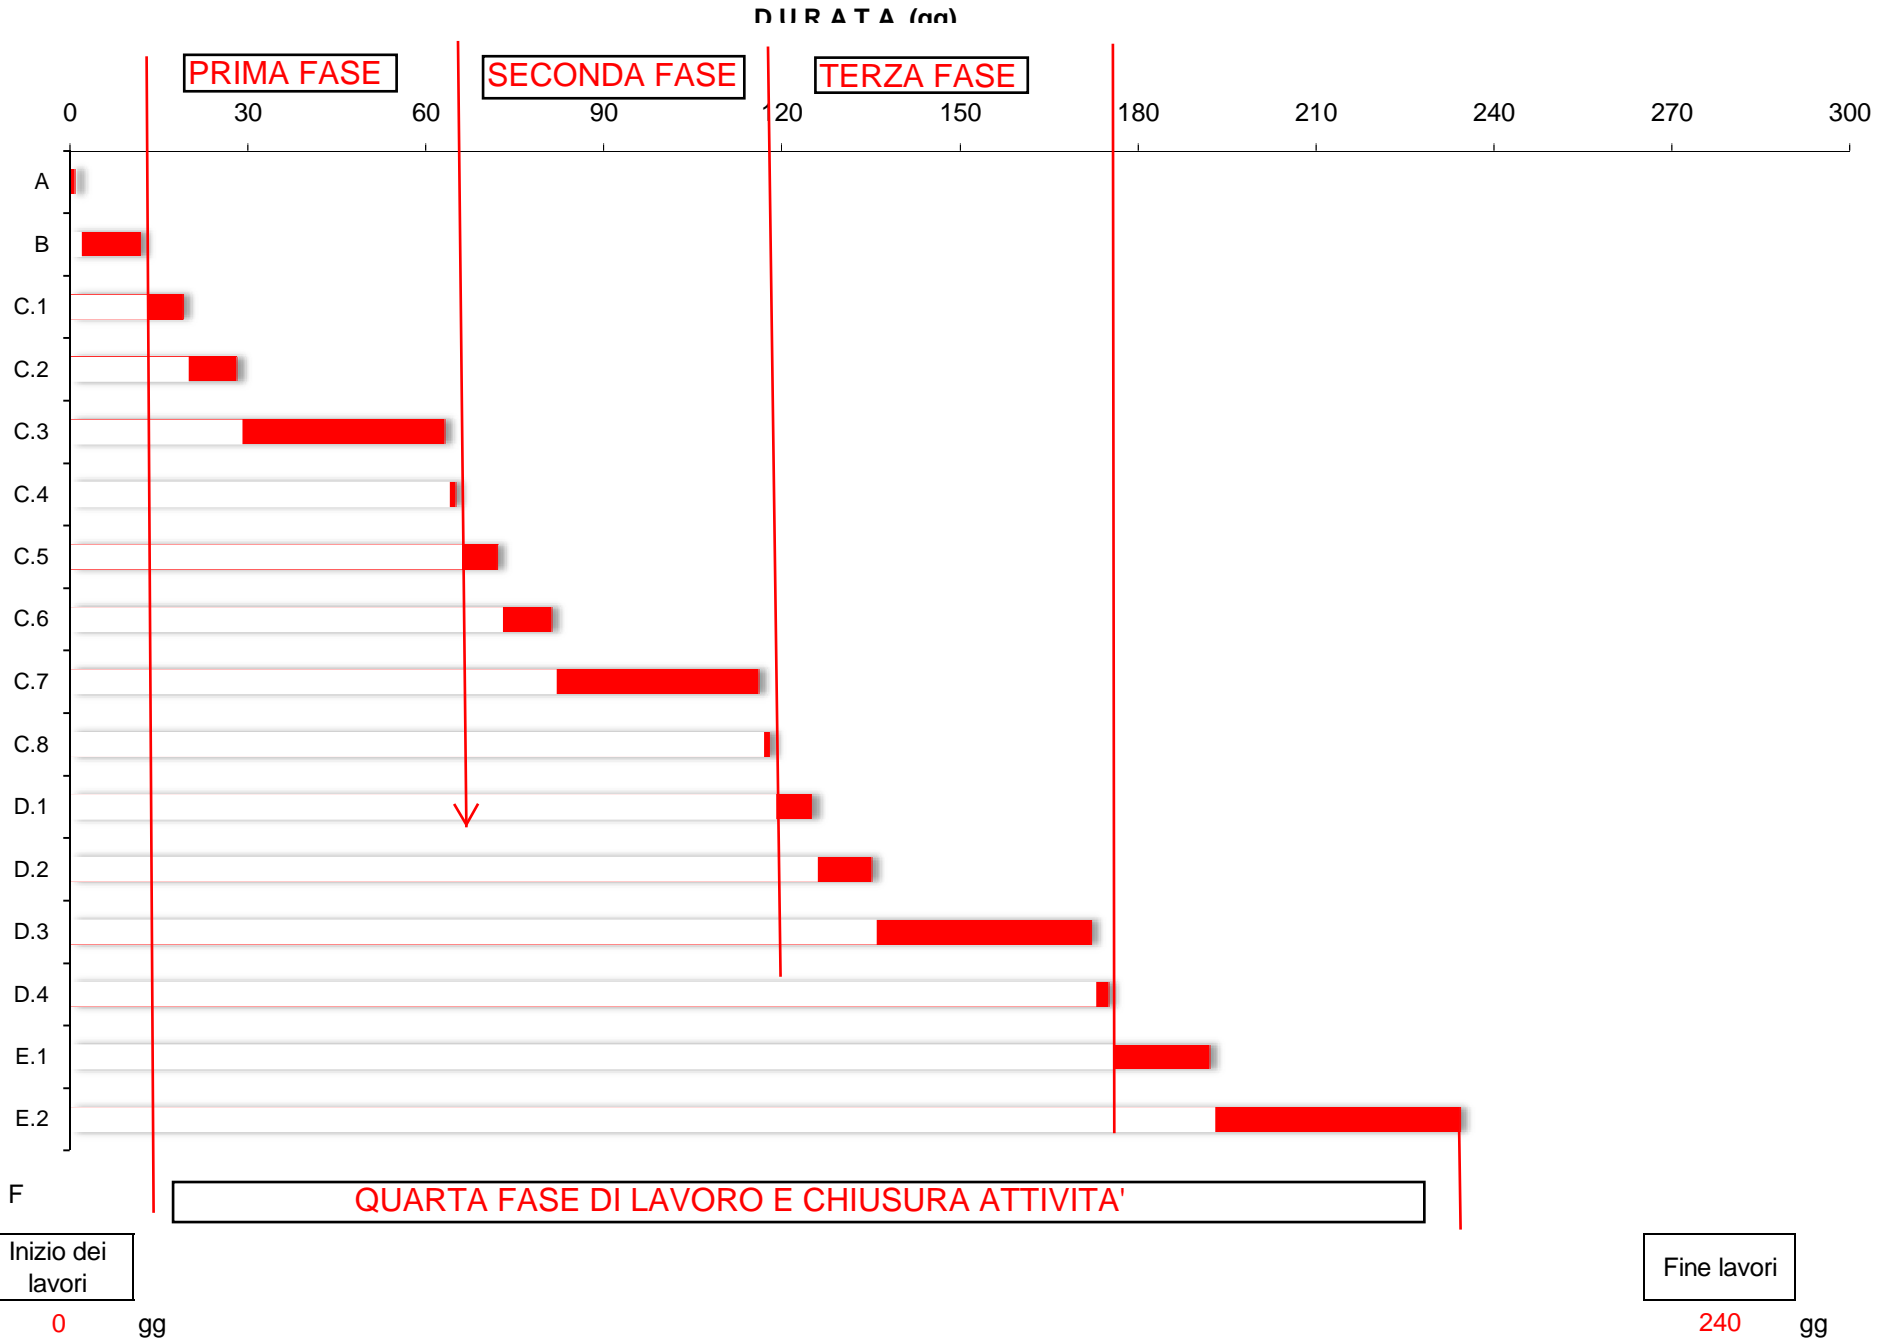

TC 240 gg. naturali consecutivi
