



ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.
in liquidazione

Zona Ind.le II fase Viale 11, n. 3/A – 97100 Ragusa
Tel. 0932/1872906

Lavori di esecuzione di indagini geognostiche e realizzazione di piezometri di monitoraggio previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del D.Lgs 59/05 e del D.Lgs 36/03, presso la discarica per rifiuti non pericolosi di C/da Cava dei Modicani in Ragusa.

7.2 CRONOPROGRAMMA

I Tecnici

F.to Dott. Geol. Giorgio Pisana

F.to Dott. Ing. Salvatore Accetta

F.to Dott. Chim. Fabio Ferreri

Cronoprogramma delle Lavorazioni

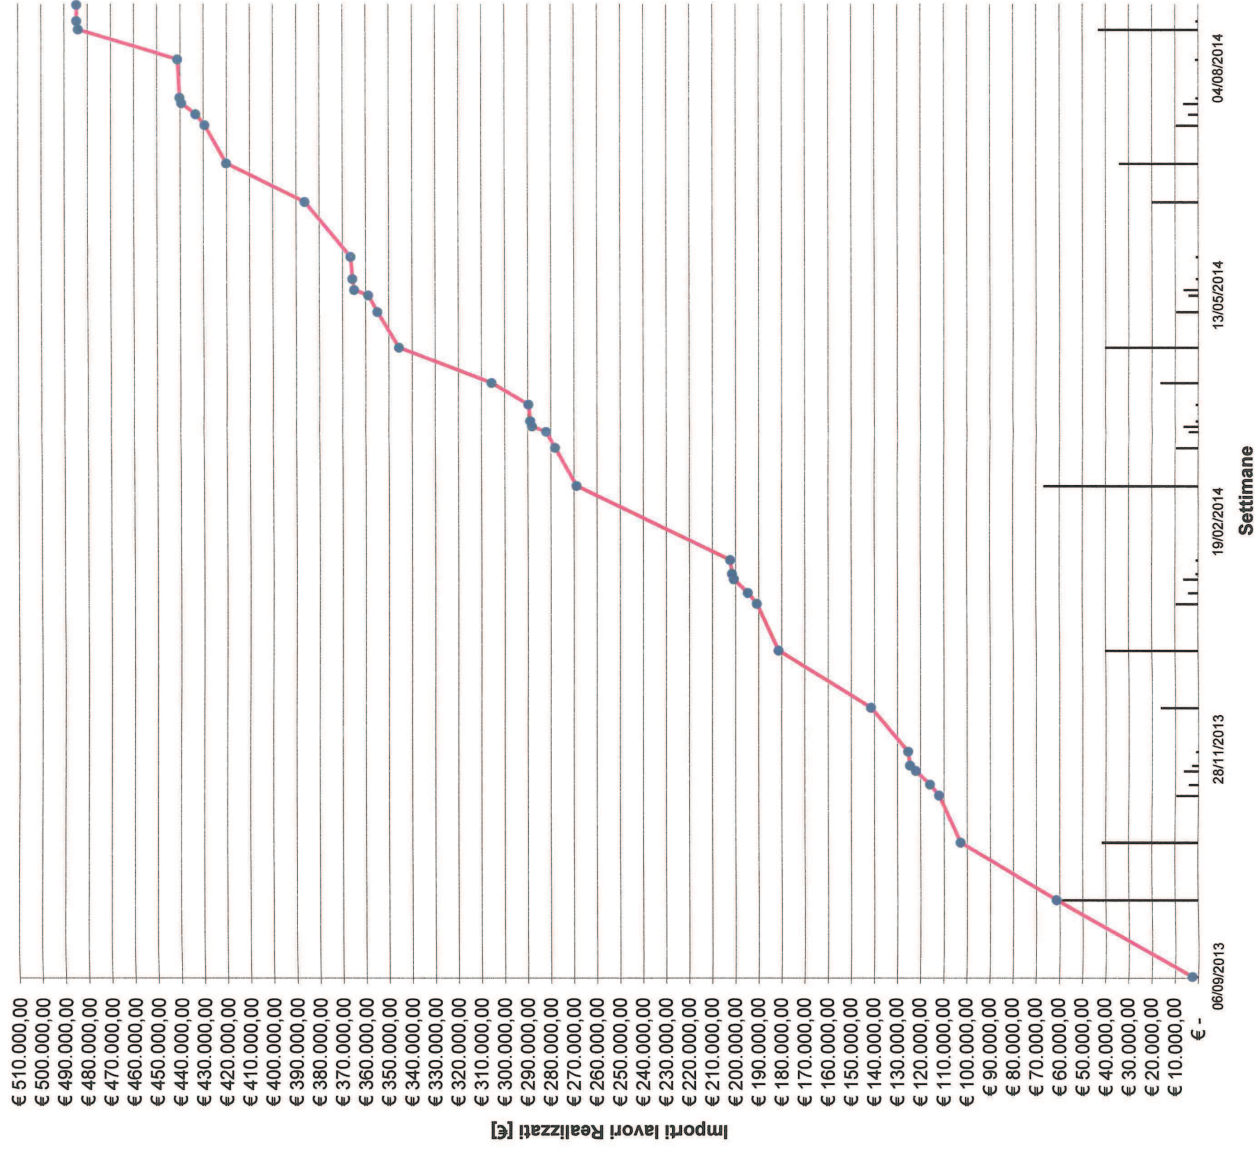


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE						
Realizzazione della viabilità del cantiere	6	E	2	2	02/09/2013	03/09/2013
	4	E	2	2	25/11/2013	26/11/2013
	5	E	2	2	03/02/2014	04/02/2014
	3	E	2	2	20/05/2014	21/05/2014
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	6	E	2	2	03/09/2013	04/09/2013
	4	E	2	2	26/11/2013	27/11/2013
	5	E	2	2	04/02/2014	05/02/2014
	2	E	2	2	31/03/2014	01/04/2014
	3	E	2	2	22/05/2014	23/05/2014
Realizzazione della barriera di protezione e delimitazione	6	E	2	2	05/09/2013	06/09/2013
	4	E	2	2	26/11/2013	27/11/2013
	5	E	2	2	04/02/2014	05/02/2014
	2	E	2	2	02/04/2014	03/04/2014
	3	E	2	2	26/05/2014	27/05/2014
INDAGINI GEOGNOSTICHE - STRATIGRAFIE						
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	6	E	20	26	09/09/2013	04/10/2013
PERFORAZIONI						
Alesaggio del foro	6	E	15	19	07/10/2013	25/10/2013
	4	E	12	16	28/11/2013	13/12/2013
	2	E	6	8	04/04/2014	11/04/2014
	3	E	12	19	29/05/2014	16/06/2014
Perforazioni	4	E	12	19	16/12/2013	03/01/2014
	5	E	19	27	06/02/2014	04/03/2014
	2	E	8	11	14/04/2014	24/04/2014
	3	E	10	14	17/06/2014	30/06/2014
ISTALLAZIONE PIEZOMETRI						
istallazione tubi piezometrici in pvc	6	E	10	15	28/10/2013	11/11/2013
	4	E	10	14	07/01/2014	20/01/2014
	5	E	10	14	05/03/2014	18/03/2014
	2	E	7	10	28/04/2014	07/05/2014
	3	E	10	14	01/07/2014	14/07/2014
Cementazione con getto di boiaccia di cemento	6	E	4	4	12/11/2013	15/11/2013
	4	E	4	4	21/01/2014	24/01/2014
	5	E	4	6	19/03/2014	24/03/2014
	2	E	4	6	08/05/2014	13/05/2014
	3	E	4	4	15/07/2014	18/07/2014
istallazione pompe	6	E	3	3	18/11/2013	20/11/2013
	4	E	3	3	27/01/2014	29/01/2014

Tabella Analitica Gantt

	5	E	2	2	25/03/2014	26/03/2014
	2	E	2	2	14/05/2014	15/05/2014
	3	E	2	2	21/07/2014	22/07/2014
IMPIANTO ELETTRICO						
Scavo a sezione ristretta	8	E	10	14	25/07/2014	07/08/2014
cablaggio parti elettriche	8	E	6	11	08/08/2014	18/08/2014
Rinterro di scavo	8	E	3	3	19/08/2014	21/08/2014
SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Smobilizzo del cantiere	6	E	2	2	21/11/2013	22/11/2013
	4	E	2	2	30/01/2014	31/01/2014
	5	E	2	2	27/03/2014	28/03/2014
	2	E	2	4	16/05/2014	19/05/2014
	3	E	2	2	23/07/2014	24/07/2014
	8	E	4	6	22/08/2014	27/08/2014

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = P1

2) = P2

3) = P3

4) = P4

5) = P5

6) = P6

7) = P7

8) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
